



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 24/10/2017	Fecha de corte de la información:	Día / Mes / Año 30/09/2017
Nombre del Gerente:	William Cifuentes Alvarez	Numero Celular: 318 848 88 88	Correo Electrónico: wocifuentes@dnpp.gov.co

1. INFORMACIÓN GENERAL

**ÁREA DE INTERVENCIÓN
Cauca**




Departamento:	Cauca
No. de Municipios en el Contrato Plan:	13 (Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio)
Fecha de Inicio de Negociación:	12/03/2012
Fecha de Suscripción:	19/01/2013
Año de inicio:	2012

	Inicial	Después de Otro Sí
Plazo de ejecución:	3 años	4 años
Año de terminación:	2016	2019

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:

Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca.
Eje Central:	<ul style="list-style-type: none"> El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las personas y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca, que permita el fortalecimiento de instituciones y comunidades, y la consolidación de un territorio integralmente seguro, capaz de responder creativamente a nuevos desafíos.

VALOR TOTAL (Millones \$ COP):

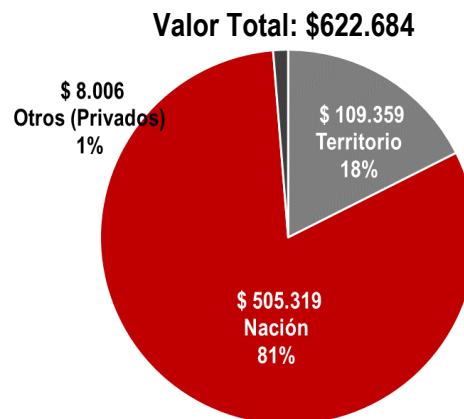



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Vigentes	No. Proyectos con Ejecución
Programa de Desarrollo Rural PDRIET	8	7
Educación	6	5
Salud	3	3
Inclusión Social y Reconciliación	2	2
Comercio, Industria y Turismo	1	1
Cultura	3	3
APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico)	33	30
Transporte	10	10
Minas y Energía	1	1
TIC	1	1
TOTAL: 10 Sectores	68	63

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES (Millones de \$COP)

SECTOR	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales) (A)	%	Compromisos DNP (B)	% Aporte DNP (B/A)
PDRIET	107.200	17.200	15%	90.000	18%	30.000	33%
Ciencia y Tecnología	33.848	2.126	2%	31.722	6%	2.000	6%
Turismo y Cultura	7.285	1.449	1%	5.836	1%	4.536	78%
Empleo e Ingresos	4.841	380	0%	4.461	1%	3465	78%
Educación	40.123	15.123	13%	25.000	5%	19.800	79%
Inclusión Social y Reconciliación	5.364	1.754	1%	3.610	1%	2.510	70%
Minas y Energía	3.898	0	0%	3.898	1%	0	0%
Salud y Protección Social	51.292	20.500	17%	30.792	6%	12.692	41%
Transporte	172.720	2.720	2%	170.000	34%	100.000	59%
Agua Potable y Saneamiento Básico	196.113	56.113	48%	140.000	28%	40.000	29%
TOTAL	622.684	117.365	19%	505.319	81%	215.003	43%



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

79%



Total Ejecución 2013 – 2017
(Millones de \$ COP)

Sector	Costo total Estimado 2013-2019 (A)	Recursos Programados 2013 - 2019 (B)	Recursos Comprometidos 2013-2019 (C)	% Avance Financiero 2013-2019 (C/A)	% Avance Financiero 2013-2019 (C/B)	% Avance Físico Compromisos 2013-2019
Agricultura y Desarrollo Rural (PDRIET)	\$107.200	\$122.031	\$79.002	74%	65%	65%
Ciencia y Tecnología	\$33.848	\$33.848	\$33.848	100%	100%	100%
Turismo y Cultura	\$7.285	\$10.493	\$6.515	89%	62%	71%
Trabajo (Empleo e Ingresos)	\$4.841	\$4.841	\$0	0%	0%	0%
Educación	\$40.123	\$46.062	\$40.721	100%	88%	55%
Inclusión Social y Reconciliación	\$5.364	\$7.359	\$5.655	105%	77%	50%
Minas y Energía	\$3.898	\$3.898	\$3.898	100%	100%	100%
Salud y Protección Social	\$51.292	\$53.600	\$39.091	76%	73%	30%
Transporte	\$172.720	\$201.846	\$188.812	109%	94%	94%
Vivienda - Agua Potable y Saneamiento Básico	\$196.113	\$196.113	\$96.557	49%	49%	55%
TOTAL	\$622.684	\$680.091	\$494.099	79%	73%	69%

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR

2017

Acumulado (2013-2017)

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS*

45%



53%



Fecha de corte: Septiembre 30, 2017

***Nota:** El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA



Prioridad Estratégica 1

**Desarrollo Rural Integral con
Enfoque Territorial**

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Porcentaje de ingreso agrícola familiar (Anual)	\$240.644	2,5%	-	-	Reporte anual	Gris	20%	2,5%	13%		Rojo	31-12-16
Familias con proyecto productivo implementado (Semestral)	0	500	1.041	100%		Verde	70	2.816	100%		Verde	30-06-17
Hectáreas intervenidas con proyectos productivos (Semestral)	0	200	621	100%		Verde	50	2.517	100%		Verde	30-06-17

SEMÁFORO



<80% >90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2017

Sector	Avances
Agricultura y Desarrollo Rural (PDRIET)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vivienda Rural: con recursos del Banco Agrario - DNP (2013), se adjudicaron subsidios SVISR en los municipios de Buenos Aires (669), Caldoño (180) y Padilla (201), ejecución que realiza el operador COMFACAUCA, viviendas que se entregaron a octubre de 2017 quedando un remanente para diciembre de 2017. Avance de obra 76%. ✓ En este mismo sector, para la vigencia 2014, el operador es UNIAUTÓNOMA en los municipios de Guachené (530) y Suarez (438), se entregarán las viviendas en octubre de 2017, quedando un remanente para diciembre de 2017. El avance de obra es del 53%. ✓ Para la vigencia 2015, el Banco Agrario definió como operador a Fiduagraria para los municipios de Caloto (530) y Corinto (438), a la fecha de corte se reporta un avance del 7% en diagnóstico y estructuración. Inversión total por valor de \$47.733 millones. ✓ En la vigencia 2014, a través de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) se ejecutaron \$216 millones para el ordenamiento productivo y de la propiedad, en 7 municipios del Norte del Cauca, beneficiando a más de 150.000 habitantes, ejecutado dentro del año en un 100%. ✓ En INCODER se vincula en 2014 al PDRIET con la asignación de 151 subsidios IPDR con una inversión aproximada de \$1.922 millones, proyecto terminado en la vigencia 2015. ✓ En junio de 2015, con recursos Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural-DNP se asignó recursos por \$8.006 millones para la implementación de 2.334 proyectos productivos para la generación de ingresos. Ejecución realizada en un 100% por el operador "Asociación de Municipios del Norte del Cauca – AMUNORCA", entregada en el mes de diciembre de 2016. ✓ Para solicitar viabilidad técnica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, se presentó el proyecto "Centro de Acopio y Transformación Agroindustrial de piña en el Norte del Cauca", proyecto que beneficia a más de 500 productores de piña y otras frutas (banano, mango, cítricos) por valor de \$3.217 millones. Se ajustaron requerimientos solicitados. ✓ El Municipio de Santander de Quilichao realiza la contratación de los estudios y diseños por valor de \$59 millones para las obras adicionales a realizar en el lote de la Plataforma o Parque Agroindustrial MILAGRO, que permita la implantación de los proyectos que componen el Parque. Se espera realizar la consultoría en el período octubre - diciembre de 2017. Se beneficiarán 7.500 pequeños productores.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA



Prioridad Estratégica 2

Desarrollo Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Nuevos cupos en educación Técnica profesional y Tecnológica en el norte del departamento del Cauca (Semestral)	0	220	0	0%		Rojo	1.035	376	36%		Rojo	30-06-17
Porcentaje de colegios con clasificación A+ A B en los resultados de las pruebas SABER 11 para los municipios beneficiados por el Contrato Plan Cauca (Anual)	2%	4%	-	-		Reporte anual Gris	43%	4%	9%		Rojo	31-12-16
Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS (Anual)	90%	91%	-	-		Reporte anual Gris	91%	91%	100%		Verde	31-12-16
Infraestructura de la red Pública hospitalaria de servicios de salud construida (Anual)	0	2	-	-		Reporte anual Gris	13	0	0%		Rojo	31-12-16
Bibliotecas Construidas (Anual)	0	1	-	-		Reporte anual Gris	5	4	80%		Naranja	31-12-16
Personas víctimas de la violencia atendidas en el Centro de Atención a Víctimas (Trimestral)	0	3.000	720	24%		Rojo	100	720	100%		Verde	30-09-17

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2017

Sector	Avances
Cultura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con recursos del Ministerio de Cultura por 3.790 millones y DNP \$600 millones se logró la construcción y entrega de las Bibliotecas Públicas de los municipios de Miranda (2013), Guachené y Caloto (2014), Corinto, Puerto Tejada, Buenos Aires, Toribio (2016), y la Casa de la Cultura del municipio de Corinto (2016) beneficiando a más de 100.000 habitantes ✓ Mediante la alianza, Instituto Nacional de Vías -INVIAS- (\$600 millones), DNP-Contratos Plan (\$400 millones) y Gobernación del Cauca (\$150 millones), se entregó la obra de adecuación de la antigua estación del ferrocarril del municipio de Suarez como Casa de la Cultura, beneficiando a más de 400 actores culturales del municipio. ✓ En coordinación con la Gobernación del Cauca, en 2015 se desarrollaron 23 propuestas de manifestaciones culturales dentro de la oferta nacional del Ministerio de Cultura por valor de \$387 millones en 8 municipios de la Subregión Norte del Cauca (Caldono, Corinto, Caloto, Guachene, Jámbalo, Miranda, Santander de Quilichao y Villarrica). Se beneficiaron más de 150 actores culturales.
Educación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fue suspendida la ejecución del proyecto de acceso y permanencia a la educación superior técnica y tecnológica, firmado en noviembre de 2013 por la Gobernación del Cauca-SGR y UNICOMFACAUCA, el cual ha otorgado 810



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

Sector	Avances
	<p>becas a jóvenes en condición de vulnerabilidad en los 13 municipios, por valor de \$6.322 millones. Presenta un avance de 93%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desde noviembre de 2013, con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, Empresarios por la Educación y UNICAUCA, se ejecuta el proyecto “Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media en 64 instituciones educativas de bajo logro en trece (13) municipios del Norte del Cauca”, por valor de \$4.422 millones. El avance es del 42%. Entró a plan de mejoramiento e intervención por parte del Departamento Nacional de Planeación-DNP. Se espera finalizarlo en diciembre de 2017. ✓ Para incrementar la oferta de carreras tecnológicas en el Norte del Cauca, se cofinancia (Recursos del DNP-Contrato Plan y SENA), la construcción del Centro de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- Norte del Cauca, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao. Obra que beneficiará a más de 4.000 estudiantes/año, contratada por \$16.004 millones. La obra física avanza conforme al cronograma establecido desde diciembre de 2016 y se proyecta entrega de obra en noviembre de 2017. Avance de obra física 63%. ✓ Se construyó el Bloque 1, primera fase del CERES municipio de Miranda. Obra contratada por valor de \$1.037 millones, beneficia a 1.000 jóvenes de la región. ✓ Se aprobó en sesión de OCAD Región Pacífico el proyecto Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria - Sede Norte de la UNICAUCA, por valor de \$9.300 millones con aportes de DNP-Contratos Plan \$2.200 millones Gobernación del Cauca-SGR \$3.300 millones y UNICAUCA \$3.800 millones, beneficiando a más de 5.000 estudiantes de la región. Se proyecta contratación en octubre de 2017 para iniciar ejecución en noviembre de este mismo año. ✓ Para incrementar los cupos del programa de Alimentación Escolar PAE en el departamento del Cauca, con recursos de DNP-Contratos Plan, se firmó con la Gobernación el contrato específico derivado el mes de junio de 2016 por valor de \$3.634 millones beneficiando a 57.681 niños y niñas del departamento, ampliación en tiempo a noviembre 2017.
<p>Inclusión Social y Reconciliación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con recursos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y del Municipio de Santander de Quilichao (\$1.050 millones incluida su dotación), terminó la construcción del Centro Regional de Atención a las Víctimas que atenderá a más de 12.000 víctimas del conflicto en el Norte del Cauca. Obra física terminada. ✓ Con aportes por \$4.504 millones (DNP-Contratos Plan) y el aporte del lote por el Municipio de Puerto Tejada, se logró iniciar la Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia -CAIF- que atenderá más de 300 familias en situación de vulnerabilidad de los Municipios de Guachené, Puerto Tejada, Villarica y Padilla, con servicios sociales como: atención a la primera infancia, salud, recreación y formación. Se tiene un avance de obra del 13%. ✓ Fue aprobado en OCAD Región Pacífico el 16 de enero de 2017, el proyecto denominado “Implementación de negocios inclusivos en la región norte del Cauca, como estrategia para la inclusión productiva y social de microempresarios con la gran industria”, que beneficia a 158 microempresas por un valor de \$2.609 millones, actualmente se encuentra etapa precontractual se proyecta iniciar ejecución en noviembre de 2017. ✓ Se viabilizó por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el proyecto “Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento Innovador en la región Norte del departamento del Cauca” por valor de \$1.442 millones, actualmente se encuentra radicado en la Gerencia Nacional de Contratos Plan para iniciar el proceso de revisión. El proyecto beneficia directamente a 60 emprendimientos, 10 Instituciones del ecosistema de emprendimiento del Norte del Cauca y 2.000 capacitados en temas relacionados. ✓ Se logró la viabilidad técnica del proyecto “Operación del Centro de Desarrollo Empresarial -CDE- en la región norte del departamento del Cauca” por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Proyecto que inicia la búsqueda de cierre financiero por valor de \$1.500 millones. Hacen parte del CDE mediante Acuerdo firmado: Gobernación del Cauca, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, Cámara de Comercio Cauca, Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena Regional Cauca, Corporación Universitaria UNICOMFACAUCAC y la Asociación de Municipios del Norte del Cauca -AMUNORCA-
<p>Salud y Protección Social</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través del mejoramiento de la Red de Salud Pública del Norte del Cauca se vienen adelantado las siguientes actividades:



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> - En 2014, el Municipio de Santander de Quilichao adquiere y cede a la ESE el lote para la reubicación del Hospital de Nivel II con inversión de \$1.500 millones. Los estudios y diseños fueron financiados con recursos del Municipio y la ESE Francisco de Paula Santander por valor de \$400 millones. Se benefician a más de 385.000 habitantes. - En el mes de agosto Inició la obra para la “Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE - Santander de Quilichao - Departamento del Cauca” por un valor de \$35.489 millones, Esfuerzo tripartito entre el DNP Contratos Plan (\$15.000 millones), Ministerio de Salud y Protección Social (\$8.629 millones), Gobernación del Cauca-SGR (\$12.060 millones) y la ESE Francisco de Paula Santander (aporta el lote) beneficiando a más de 385.000 habitantes de la región avance de obra 3%. - Fue aprobado el 9 de agosto de 2017 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión región pacifico OCAD, el proyecto denominado “Dotación Hospitalaria en 9 municipios de la región norte del Cauca” por valor de \$3.348 millones, para su revisión documental y posterior aprobación, se benefician más de 285.000 habitantes y se proyecta contratación en octubre de 2017. ✓ Actualmente, se adelanta la estructuración de 4 proyectos en el sector salud: <ul style="list-style-type: none"> - Se contrataron estudios y diseños por valor de \$75 millones para la reubicación, construcción del “Centro-Hospital del municipio de Villarica”. El Ministerio de Salud y Protección Social aprobó el programa y la planta médico-arquitectónica del centro de salud. Para el mes de octubre, se proyecta la aprobación por parte del Ministerio de Salud de la planimetría –ingenierías que soporta los estudios de la planta arquitectónica, planos estructurales, hidráulicos, voz, datos y red contra incendios–, beneficiando a una población de más de 15.000 habitantes. ✓ Reubicación, construcción del Hospital del municipio de Miranda. Se avanza en el proceso de la firma convenio interadministrativo entre la alcaldía del municipio de Miranda y la ESE Norte 2 para la contratación de los estudios y diseños del hospital se proyecta su legalización el 31 octubre 2017, se espera beneficiar a más de 37.000 habitantes. ✓ Se contrataron estudios y diseños por valor de \$30 millones para la construcción del Centro de Salud Corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires. El Ministerio de Salud y Protección Social aprobó el programa médico arquitectónico y la capacidad instalada que permite continuar con el proceso de estructuración del proyecto, la alcaldía adelanta gestiones ante el concejo municipal para la entrega del lote a la ESE Norte 1 el próximo 15 de octubre de 2017; se espera beneficiar a más de 29.900 habitantes. ✓ Reubicación, construcción del Centro-Hospital del municipio de Padilla. La alcaldía del municipio de Padilla presentó para aprobación del Concejo Municipal, la cesión del lote donde se construirá el hospital a la ESE Norte 3, sanción que se espera tener el 31 de octubre de 2017. ✓ Con aportes de la Gobernación del Cauca, las ESEs 1,2 y 3 del Norte del Cauca y los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Torbio, Padilla, se logró, la dotación de 9 ambulancias para los hospitales de la región, por valor de \$1.527 millones.




Prioridad Estratégica 3

Desarrollo Productivo y Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance			Meta	Avance	% avance			
Familias vinculadas a la cadena turística (Semestral)	0	50	0	0%		Rojo	15	0	0%		Rojo	30-06-17

SEMÁFORO



<80%

>90%



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2017

Sector	Avances
Turismo	✓ Con recursos de la Gobernación del Cauca-SGR (2013), los 13 Municipios y la Corporación de Turismo del Cauca, se ejecuta el proyecto "Turismo Posible y Deseable en el Norte del Cauca", por valor de \$1.737 millones, que beneficiará a más de 300 familias bajo el modelo de turismo comunitario, con duración de 18 meses. Avance de ejecución 61%.



Prioridad Estratégica 4

Infraestructura y Gestión Ambiental

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Número de personas beneficiadas con proyectos de alcantarillado (Anual)	0	-	-	-		Gris	-	-	-		Gris	31-12-16
Número de personas beneficiadas con proyectos de acueducto (Anual)	0	20.000	-	-		Gris	-	-	-		Gris	31-12-16
Kilómetros intervenidos en las vías secundarias en marco de la ejecución del CP Norte del Cauca (Anual)	0	70	-	-		Gris	-	-	-		Gris	31-12-16
Hogares beneficiados con la construcción redes eléctricas de alta o media tensión (Anual)	0	228	-	-		Gris	380	0	0%		Rojo	31-12-16
Establecimientos Educativos beneficiados por los programas de MinTIC (Semestral)	0	336	150	45%		Rojo	336	486	100%		Verde	30-06-17

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2017

Sector	Avances
Minas y Energía	✓ El proyecto de ampliación en cobertura de energía rural en el Municipio de Buenos Aires, por valor de \$3.898 millones, financiado en su totalidad con recursos de Ministerio de Minas, se encuentra ejecutado, con un avance físico del 100%. Se benefició a más de 374 familias.
Transporte	✓ Se realizaron los siguientes estudios y diseños viales: <ul style="list-style-type: none"> - Estudios y diseños para la pavimentación de la Vía Silvia – Jambaló por \$785 millones(ejecutado). Beneficiando aproximadamente 41.000 habitantes. - Estudios y Diseños para la Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Puerto Tejada-La Sofía-Guachené - Crucero Gualí, incluye estudios Rehabilitación Puente Rio Palo por valor de \$ 497 millones (ejecutado). La obra beneficia a más de 22.000 habitantes. - Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía 3 Caloto- La Placa por \$375 millones (ejecutado). Beneficiando a una población 23.009 habitantes.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> - Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Suarez - Timba y rehabilitación por valor de \$233 millones (ejecutado). Beneficia a una población de 31.000 habitantes. - Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Morales – Suarez por \$137 millones (ejecutado). Beneficia una población de 19.244 habitantes. - Estudios y Diseños de Estructuras para la Atención de Sitios Críticos en la Vía Torbio-Rio Negro-El Palo por valor de \$54 millones (ejecutado). Beneficiarios 2.098 habitantes. ✓ Se avanza en la ejecución de los siguientes proyectos viales: <ul style="list-style-type: none"> - La Rehabilitación de la vía Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por \$15.837 millones, permite rehabilitar 10 km y beneficia una población de 144.220 habitantes que transitan en esta importante vía que comunica al norte del departamento del Cauca con el Valle y centro del país. Proyecto ejecutado y liquidado. - Construcción del Pavimento de la Vía La Balsa-Buenos Aires, obra financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por valor de \$21.586 millones, iniciada en agosto de 2014, beneficia a una población de 29.267 habitantes. Proyecto liquidado. - Construcción de Pavimento de La Vía La Toma-Suarez, Municipio de Suarez, obra financiada con recursos de INVIAS por valor de \$19.214 millones, obra iniciada en enero de 2015, beneficia una población de 19.244 habitantes. Proyecto adicionado en recurso y plazo. Ejecutado 100% en recibo. - Construcción de Pavimento y Rehabilitación de la Vía Siberia- Caldono, Municipio de Caldono. Obra financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan por valor de \$22.380 millones, obra iniciada en enero 2015, población beneficiada 25.864 habitantes. Proyecto ejecutado 100% y liquidado. - Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se contrató el Mejoramiento y Pavimentación de 13 km de la Vía Caloto-La Placa, por valor de \$18.271 millones, beneficiando a una población 23.009 habitantes, ejecución inició el 30 de junio de 2015. Proyecto ejecutado 100%. En liquidación. - Rehabilitación de la vía Suárez-Asnazú-Timba entre el PR0+919 AL PR5+330 por valor de \$ 4.705 millones, financiados con recursos del Ministerio de Transporte. Contrato firmado el 13 de agosto de 2015 y beneficia a una población de 31.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 100%, en liquidación. - Se avanza en Mejoramiento y Pavimentación de La Vía 26cc01-1 Suarez-Asnazú-Timba en el Tramo Comprendido entre el Pr5+330 y el Pr9+582,8 por valor de \$ 5.330 millones. Proyecto adicionado en recurso y plazo. Ejecutado 100%, en liquidación. Beneficia a una población de 31.000 habitantes. - Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se adjudicó la pavimentación de 17,4 Km de la vía Silvia-Jambaló, por valor de \$32.534 millones beneficiando a más de 41.000 habitantes, ejecución iniciada en diciembre de 2015. Suspendido por licencia de aprovechamiento forestal. La Sustracción de Áreas de Reserva Forestal se obtuvo el 27 de julio mediante resolución del Ministerio. Avance de obra física 39%. reinició el avance es del 41% - La Rehabilitación y Pavimentación de La Vía 25cc27 Puerto Tejada- La Sofía-Obando-Guachené- Crucero De Gualí - Sector 3 - Tramo Comprendido Entre El Pr15+060 Al Pr21+711, por valor de \$ 5.647 millones. Proyecto Ejecutado 100%, en liquidación. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes. - Rehabilitación del Puente Sobre El Río Palo En La Vía 25cc27 Puerto Tejada-La Sofía-Obando-Guachené-El Crucero Gualí con una inversión de \$1.464 millones. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes, avance de obra física 100%. En liquidación. ✓ En el Municipio de Miranda se interviene en la vía Miranda-Santa Ana, con pavimento en un tramo de 7 Kms, con una inversión inicial de \$10.208 millones. La obra beneficia cerca de 15.000 habitantes, proyecto ejecutado 100%. En recibo y liquidación. ✓ En el tramo El Palo-Torbio se recuperan 3 sitios críticos de los que presenta esta vía que permita mejorar la seguridad en el tránsito, cuenta con una inversión de \$977 millones. Proyecto ejecutado 100% y liquidado. Beneficiarios 2098 habitantes. ✓ Se avanza con el Mejoramiento y pavimentación de la vía 26CC01 Morales - Suárez en el Municipio de Suárez Cauca. Pavimentación de 1.6 km. Avance de obra física 99%, por valor de \$3.209 millones beneficia una población de 19.244 habitantes.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se contrató el estudio Fase II de Infraestructura Logística Especializada -ILE- en la sub-región Norte del Cauca, que busca determinar la factibilidad técnica, económica, social, ambiental y financiera de construir una infraestructura para brindar servicios de logística a las empresas e industrias ubicadas en el norte del Cauca, la Gobernación del Cauca adelanta dicho estudio con plazo final de entrega el 31 de diciembre. Por valor de \$ 637 millones y los estudios determinarán la población beneficiada. Contrato en legalización. ✓ Estudios y diseños para la ampliación y/o rehabilitación del puente menor ubicado en el PR 09+584 de la ruta 25CC11 Puerto Tejada - Puente Hormiguero Municipio de Puerto Tejada. Proyecto en recibo por parte de la interventoría. Por valor de \$ 1.464 millones y la obra beneficia a más de 22.000 habitantes ✓ Estudios y diseños para pavimentación de la vía 26CC01: Morales - La Toma - Suarez en los sectores PR09+545 (80m) y PR 16+507 al PR 20+000 departamento del Cauca. Proyecto en recibo por parte de la interventoría. Beneficia una población de 19.244 habitantes. ✓ Entre 2013 y 2017, se logró Inversiones por parte del Ministerio de TICs por valor \$33.848 millones en los 13 municipios en componentes como: conectividad, fibra óptica, computadores para educar, tabletas para educar, kioskos digitales, gobierno en línea y otros programas de su oferta institucional. Se benefició más de 105.000 estudiantes.
<p>Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terminó la ejecución de la primera fase del Proyecto Acueducto Regional del Norte del Cauca con cobertura en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villarica y Guachené y zona rural de Caloto, por valor de \$27.835 millones. Se beneficia a más de 180.000 habitantes. ✓ Findeter contrató la consultoría especializada para el acompañamiento a la puesta en marcha del Acueducto Regional del Norte del Cauca, por valor de \$201.449 millones y la Interventoría por valor de \$46.143 millones. Se beneficia a más de 180.000 habitantes ✓ En ejecución por parte del DNP-SGR, FONADE la Estructuración Integral de 11 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Municipios de Jambaló, Caloto, Guachené, Toribio y Puerto Tejada. Terminó la Fase II, se socializaron las alternativas de diseño y se suscribieron las actas de concertación con los municipios. Se proyecta la entrega de diseños en el tercer trimestre de 2017. Valor \$1.923 millones que incluye el valor de la interventoría. Se beneficia a más de 34.000 habitantes ✓ Con el propósito de beneficiar a 95.207 habitantes, en 2013-2014 se financiaron 3 proyectos a través de EMCASERVICIOS por valor de \$3.419 millones: Alcantarillado Asnazú, Municipio de Suárez \$1.514 millones, Acueducto Interveredal Isabelillas, Municipio de Toribio \$1.235 millones y terminado el proyecto alcantarillado Corregimiento Chamizo por valor de \$670 millones. ✓ En ejecución el proyecto Alcantarillado cabecera municipal de Padilla por valor de \$5.823 millones financiado con recursos del Contratos Plan-DNP y EMCASERVICIOS, avance de obra 95%. Suspendido. Reformulación aprobada en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. El reinicio depende de la ampliación del convenio el cual debe pasar por el Consejo Municipal. Se beneficia más de 9.776 habitantes. ✓ Con recursos de DNP-Contratos Plan, Findeter adelantó la contratación del proyecto “Construcción y optimización del sistema de alcantarillado 2da etapa en la cabecera Municipal de Guachené”, por valor de \$1.073 millones, beneficiando a 6.892 habitantes, tiempo de obra 9 meses. Este proyecto Terminó Fase II, el MVCT aprobó la reformulación No. 2. El 20 de junio inició Fase III del proyecto que es la construcción. Plazo 6 meses se prevé su terminación al 20 de diciembre de 2017. El avance actual de la obra es del 30% ✓ Con recursos de DNP-Contratos Plan, Findeter adjudicó la construcción del alcantarillado pluvial en la cabecera municipal de Caldone, por valor de \$1.668 millones más la interventoría de \$196 millones. Con el desarrollo del proyecto, 1.400 habitantes de la cabecera municipal contarán con un sistema de alcantarillado pluvial. Para la Fase III del proyecto el Municipio de Caldone aportará \$205 millones resultantes de la reformulación. Findeter se encuentra en elaboración el otrosí No. 1 del contrato de obra para adicionar los recursos dicho valor, posteriormente se suscribirá el acta de inicio de la Fase III. ✓ Con recursos de DNP-Contratos Plan, Findeter adjudicó la optimización sistema acueducto cabecera municipal municipio de Corinto, por valor de \$1.544 millones, beneficiando a más de 18.500 habitantes. Este proyecto terminó



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

Sector	Avances
	<p>Fase II. El Ministerio remitió oficio a Findeter debido al incumplimiento en la entrega del proyecto de reformulación. El 14-Ago/17: Findeter dio traslado a la Interventoría de los nuevos descargos presentados por el contratista.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con recursos de DNP-Contratos Plan, Findeter adjudicó la consultoría de “Ajuste y complemento de los estudios y diseños para la Construcción de la Planta de Potabilización Interveredal Vereda Isabelillas- Municipio de Toribio, Cauca” por valor \$176 millones, incluido IVA. Igualmente se contrató la interventoría por valor de \$67 millones. Según lo informado por Findeter, se encuentra en legalización por parte de la Fiduciaria Bogotá, la documentación para suscribir el respectivo contrato para dar inicio a la ejecución del proyecto. Beneficiarios proyectados 6.465 habitantes. ✓ Se contrataron las obras “Mejoramiento y Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Miranda” con recursos del DNP, proyecto con una inversión de \$3.113 millones más la interventoría por valor de \$290 millones, beneficiando a 29.290 habitantes aproximadamente. Este proyecto terminó ejecución en Fase II. El 9 de junio fue aprobada la reformulación No. 3. Según lo informado por Findeter, se encuentra en trámite ante la Fiduciaria Bogotá la aprobación de pólizas, para proceder a la suscripción del acta de inicio de los contratos. ✓ Con recursos DNP-Contratos Plan, Findeter adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Zona Urbana del Municipio de Santander de Quilichao – Cauca por valor de \$7.580 millones y la interventoría por valor de \$484 millones. Beneficiará una población de 47.666 habitantes. Este proyecto terminó Fase II. El proyecto está en reformulación al MVCT. Una vez aprobados los ajustes del proyecto propuestos en la reformulación, se podrá dar inicio Fase III con la ejecución de las obras. ✓ Con recursos DNP-Contrato Plan, Findeter contrató la Construcción de la planta de tratamiento PTAP Quitapereza, cabecera municipal de Santander de Quilichao por valor de \$3.990 millones. Beneficiados 10.059 usuarios. El proyecto inició la Fase I, el 9 de junio de 2017. El 10 de julio, se suscribe el acta de terminación de la Fase I del contrato de obra e interventoría. Se realizó reunión con la interventoría y contratista con la finalidad de socializar observaciones que Findeter remitió a la interventoría observaciones al producto de la fase I. ✓ Con recursos DNP-Contrato Plan, Findeter contrató la construcción de obras de Optimización del Sistema de Alcantarillado del Municipio de Jambaló, por valor de \$ 2.532 millones. Por \$1.999 millones, el contrato inicio en diciembre de 2016 y la interventoría en febrero de 2017 por \$240 millones. Beneficiarios 1208 habitantes. Este proyecto terminó la Fase I y se encuentra en revisión de documentación previa para pasar a Fase II. El 19 de julio, el contratista de obra atiende las observaciones respecto a las pólizas del contrato de obra por parte de la Fiducia y remite actualización de pólizas nuevamente para revisión. Pendiente aprobación de pólizas por parte de la Fiducia para inicio de Fase II. ✓ Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento Acueducto Interveredal Quinamayó Alegrías (Santander de Quilichao) por valor de \$ 1.561 millones y la interventoría por valor de \$119 millones. El proyecto se ejecutó 100%. Beneficiarios 5.600 habitantes. ✓ Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se contrató por EMCASERVICIOS la Construcción de Sistema Interveredal y Obras de Optimización Tanques de Almacenamiento Zona Baja del Municipio de Jambaló por valor de \$2.682 millones, más la interventoría por valor de \$188 millones, tiene un avance de ejecución en la obra del 95%. Beneficiarios actualmente: 1.282 habitantes y proyectada 1.780 habitantes. Continúa suspendido por reformulación en Ministerio. ✓ Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca se adjudicó la Construcción y Optimización Sistema de Acueducto Veredas La Playa, Soto, La Luz, Buenavista y La Laguna (Toribio), por valor de \$5.154 millones más la interventoría por valor de \$418 millones; proyecto que beneficia a una población de 16.213 habitantes. tiene un avance de ejecución en la obra del 90%. Continúa suspendido para reformulación en Ministerio. ✓ EMCASERVICIOS mediante convenio con la APC Acueducto Piendamó - Morales, contrato la estructuración para realizar los estudios y diseños para la Ampliación del Acueducto Regional que incluye la Vereda La Toma del Municipio de Suarez por valor de \$821 millones. Proyecto en ejecución, tiene un avance reprogramado de 55%. Beneficiarios 1.980 habitantes. ✓ Con aportes por valor \$17.939 millones (DNP-Contratos Plan), se logró la financiación del proyecto denominado “Optimización sistema de acueducto del Municipio de Puerto Tejada, Fase II Redes de distribución” que busca



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL NORTE DEL CAUCA

Sector	Avances
	<p>cambiar 12.000 acometidas domiciliarias en la cabecera municipal. Se inició ejecución en marzo 2017. Se reprogramó y tiene un avance de ejecución en la obra del 32.18%.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, ejecuta la Construcción de las Obras de Rehabilitación y Optimización Sistema de Acueducto del Municipio de Puerto Tejada Fase I por valor de \$3,479 millones e interventoría por \$259 millones. Población Beneficiada 12.000 habitantes. Avance 63%✓ Con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, en junio 2017 inició la ejecución del proyecto "Plan básico de recuperación y restauración de la función ecológica en cuencas abastecedoras de acueductos de los 13 municipios del Norte del Departamento del Cauca" a través de la Corporación Ambiental CRC por valor de \$925 millones y una duración de 9 meses. El proyecto incluye actividades de reforestación, aislamiento y capacitación ambiental, entre otros beneficiarios 161.790 habitantes.
